

# 東京外かく環状道路 大泉JCT工事の状況について

（目白通り、土支田通り、東映通り他  
の道路の切り替え工事等について）



東京外環プロジェクト


# 周辺道路の工事のお知らせ

目白通りの交通規制 (5月頃から)

東映通りの切り替え・支道の廃止・歩行者通路の設置 (5月頃)

土支田通りの切り替え

凡例	
	事業用地
	道路切り替え
	既設道路廃止

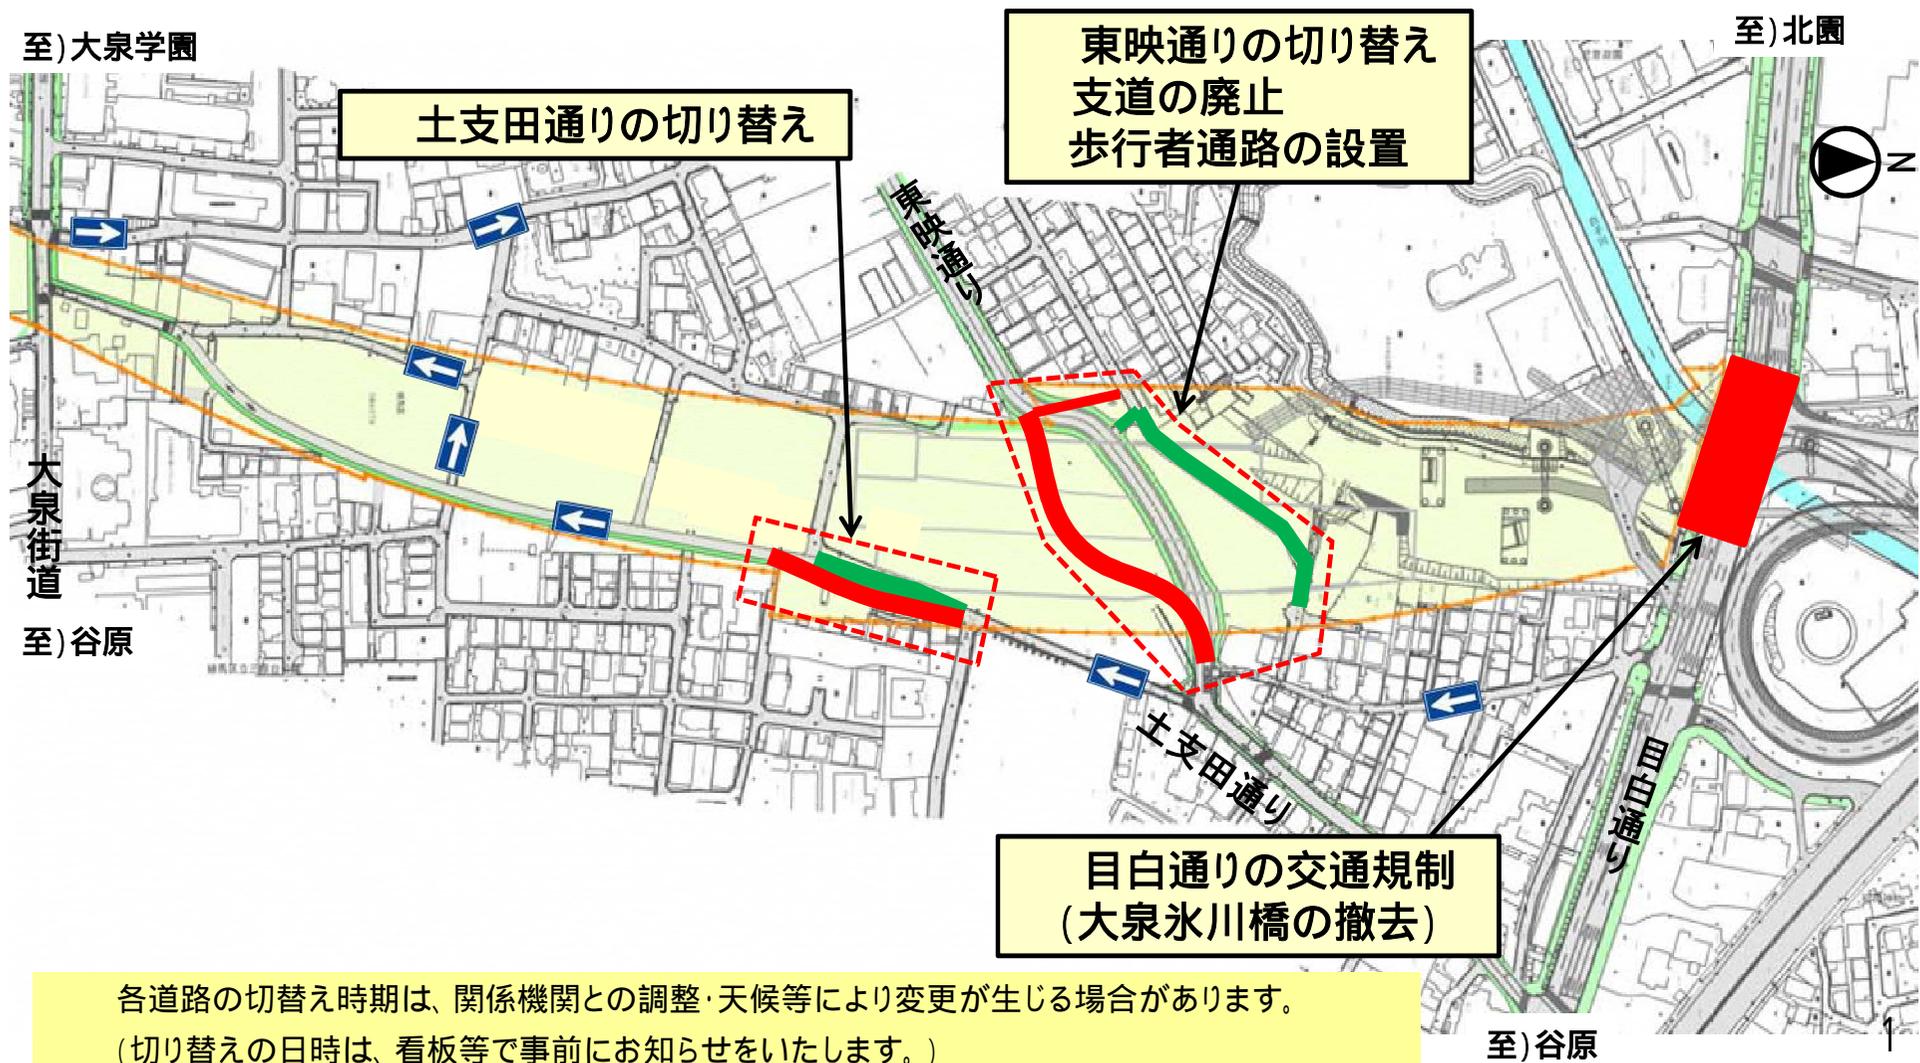


各道路の切替え時期は、関係機関との調整・天候等により変更が生じる場合があります。  
(切り替えの日時は、看板等で事前にお知らせをいたします。)

# 目白通り「大泉氷川橋」の撤去について


- ・目白通りの「大泉氷川橋」の撤去工事に取り掛かります。
- ・氷川橋は、本線北行シールドが橋の基礎杭に貫通することから、橋の機能が保てなくなるため撤去が必要です。
- ・氷川橋部分は基礎杭が不要なボックスカルバート構造に改修されます。
- ・橋の撤去工事に伴い、目白通りの一部区間において、車線規制・歩行者の迂回を含む交通規制を実施いたします。

昼間作業： 8:00 ~ 18:00

夜間作業： 20:00 ~ 6:00

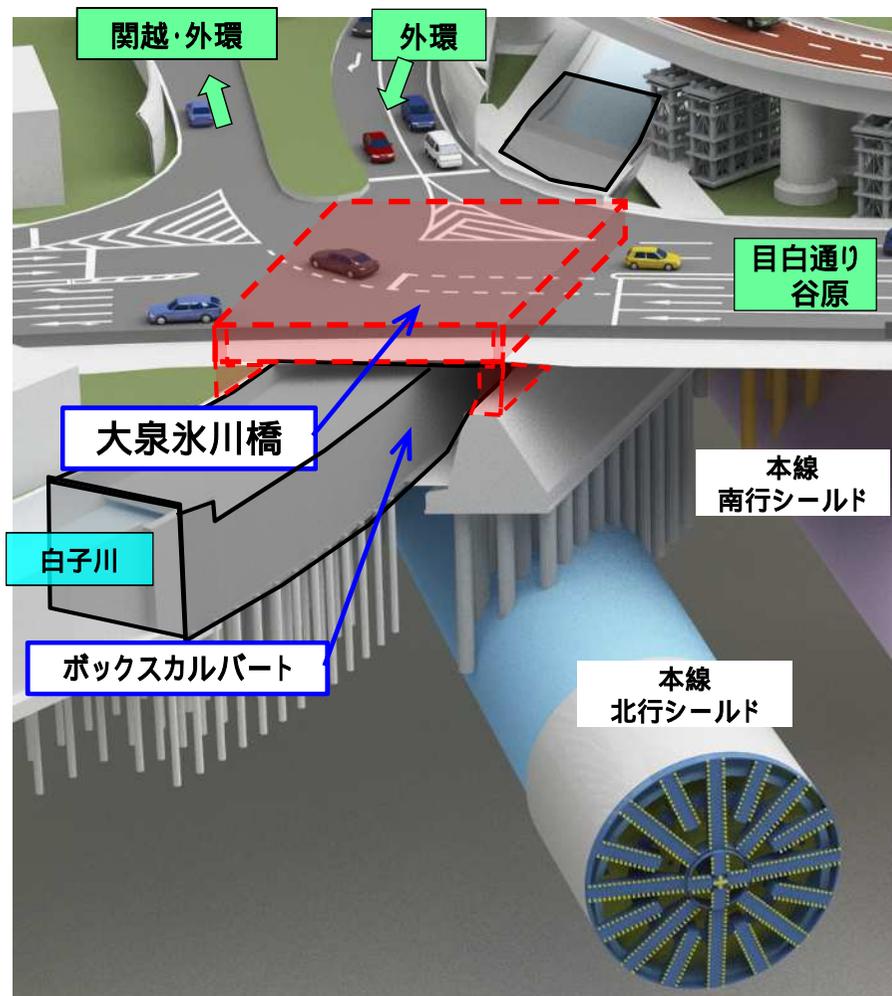

大泉氷川橋撤去箇所

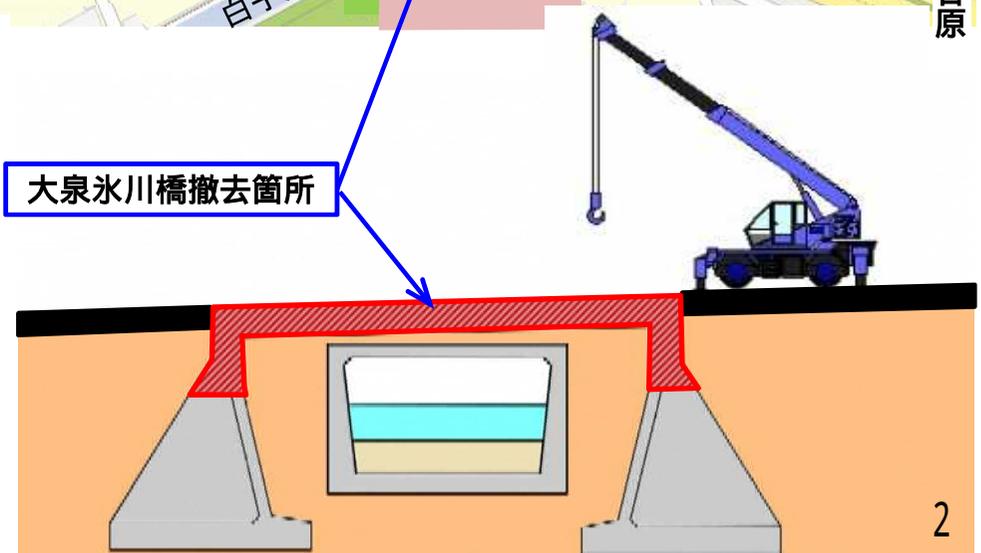


# 目白通りの道路規制【交通規制ステップ(1/2)】

ステップ①:平成29年5月～6月頃

## 常設作業帯

作業内容:歩道支障物撤去

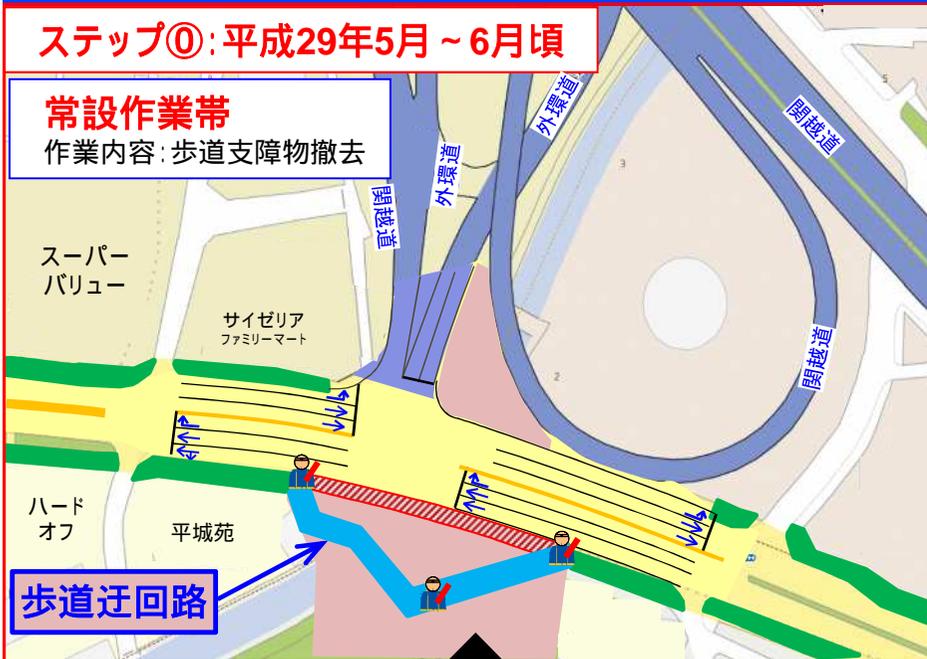

ステップ②:平成29年7月～9月頃

## 常設作業帯

作業内容:橋撤去・車道舗装



## 夜間作業時

(21:00～6:00)

作業内容:車道の拡幅



## 夜間作業時

(21:00～6:00)

作業内容:橋撤去・車道舗装




# 目白通りの道路規制【交通規制ステップ(2/2)】

ステップ :平成29年10月～12月頃

## 常設作業帯


作業内容:橋撤去・車道舗装

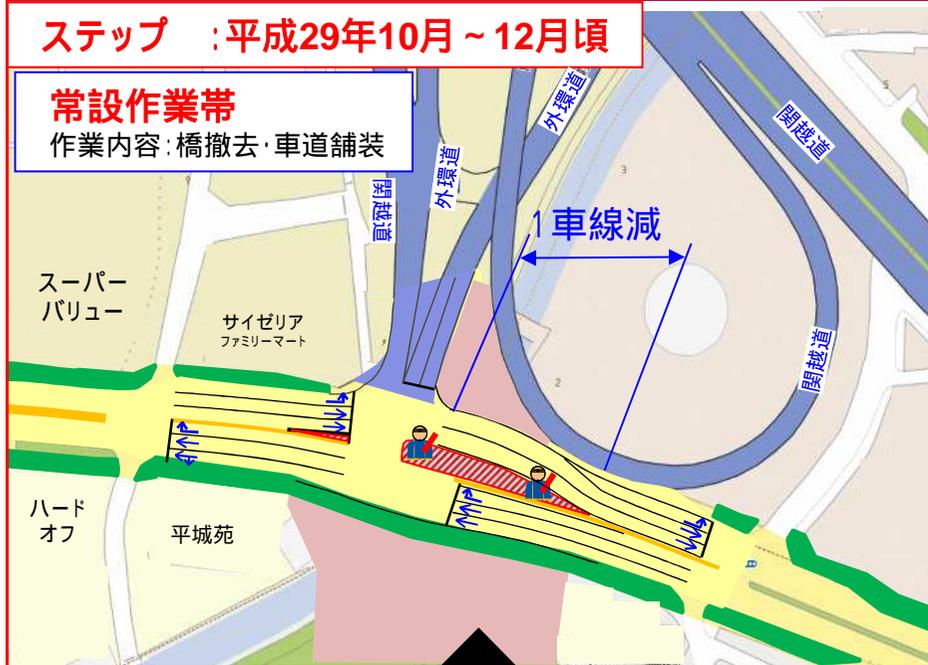

ステップ :平成30年1月～3月頃

## 常設作業帯

作業内容:橋撤去・車道舗装

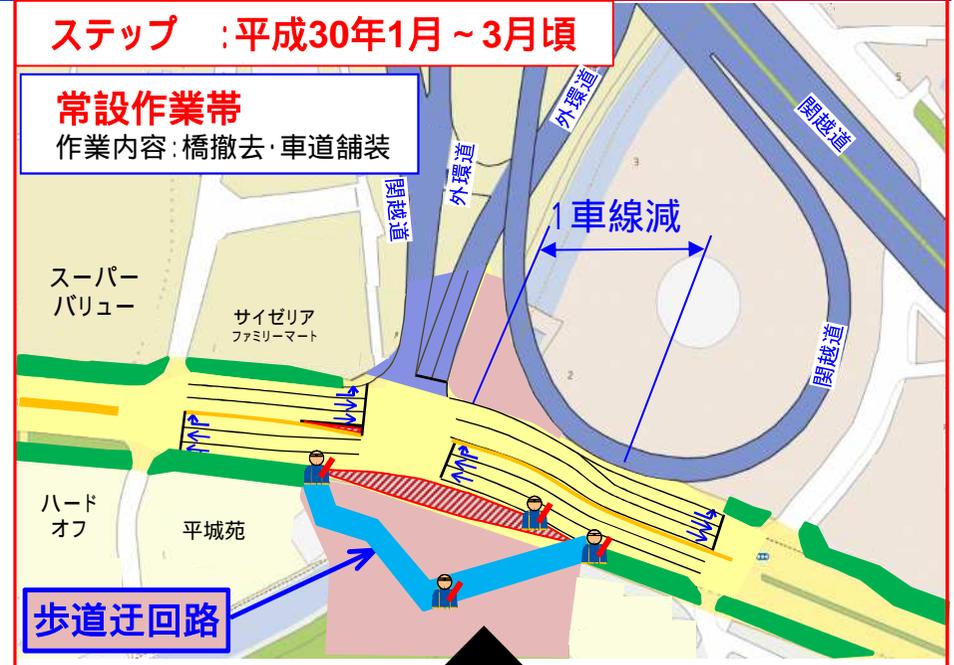


## 夜間作業時

(21:00～6:00)

作業内容:橋撤去・車道舗装

## 1車線規制

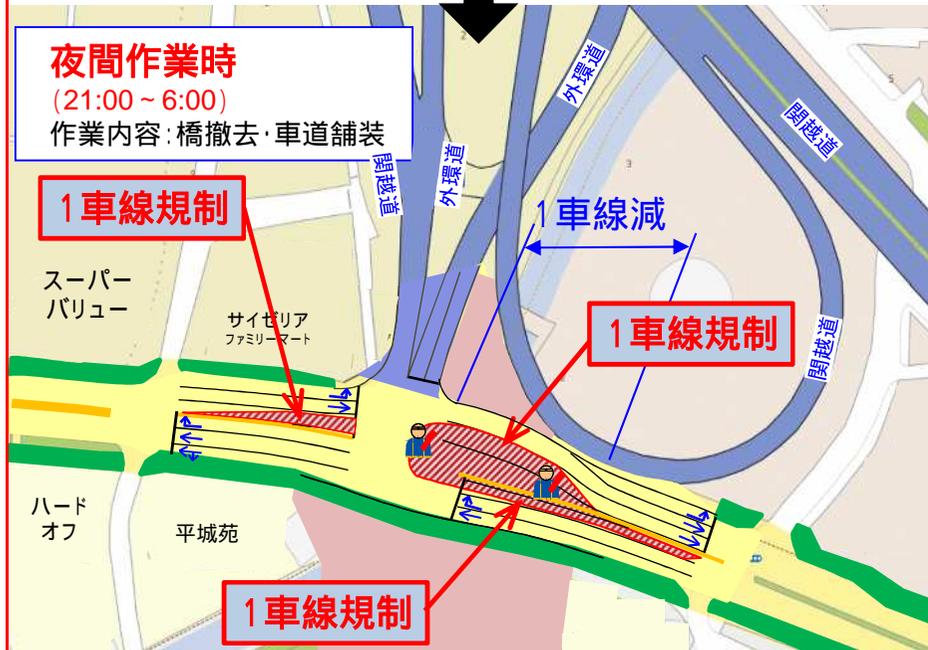


## 夜間作業時

(21:00～6:00)

作業内容:橋撤去・車道舗装

## 1車線規制

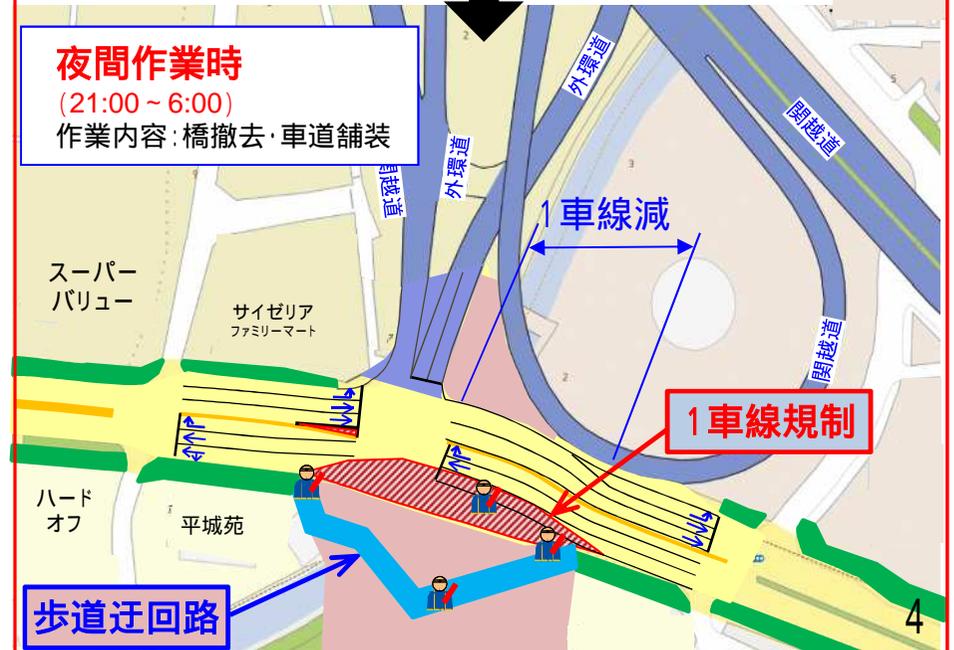

# 目白通りの道路規制の周知方法

## 看板の例

### 車両用看板

## 車線規制 のお知らせ

この先、氷川橋撤去工事に伴い、  
**大泉インター入口交差点付近で  
車線規制を行います。**  
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、  
ご協力をお願いいたします。

期間 平成29年7月～平成30年3月まで

東京外かく環状国道事務所 大泉出張所  
株式会社 大林組  
TEL 03-0000-0000

### 歩行者用看板

## 歩道迂回路 のお知らせ

この先、氷川橋撤去工事に伴い、  
歩道の通行止めを行っております。  
**迂回路のご利用をお願いいたします。**



東京外かく環状国道事務所 大泉出張所  
株式会社 大林組  
TEL 03-0000-0000

## 横断幕の例

平成29年7月～平成30年3月まで

この先、氷川橋撤去工事に伴い、

**大泉インター入口交差点付近で車線規制を行います。**

### 横断幕の設置イメージ

#### 例) 三軒寺交差点 横断歩道




横断幕は歩道橋などに設置する予定としております。

関係機関との調整・天候等により変更が生じる場合があります。

看板、横断幕の設置箇所については関係機関との調整を行い決定します。

# 東映通りの仮棧橋(路面覆工)について


東映通りの仮棧橋平面図

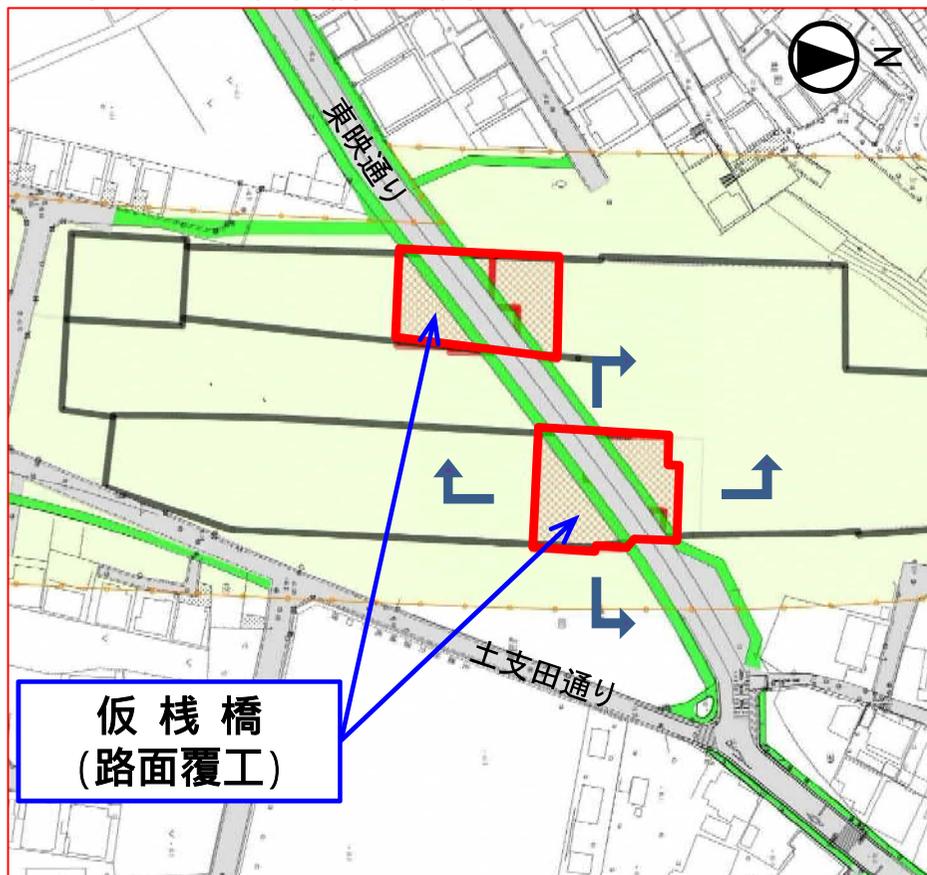


仮棧橋  
(路面覆工)

土留め工事完了後、掘削やボックスカルバートの構築を行います。仮棧橋を設置することで、東映通りの交通規制や通行止めが回避されます。

断面図

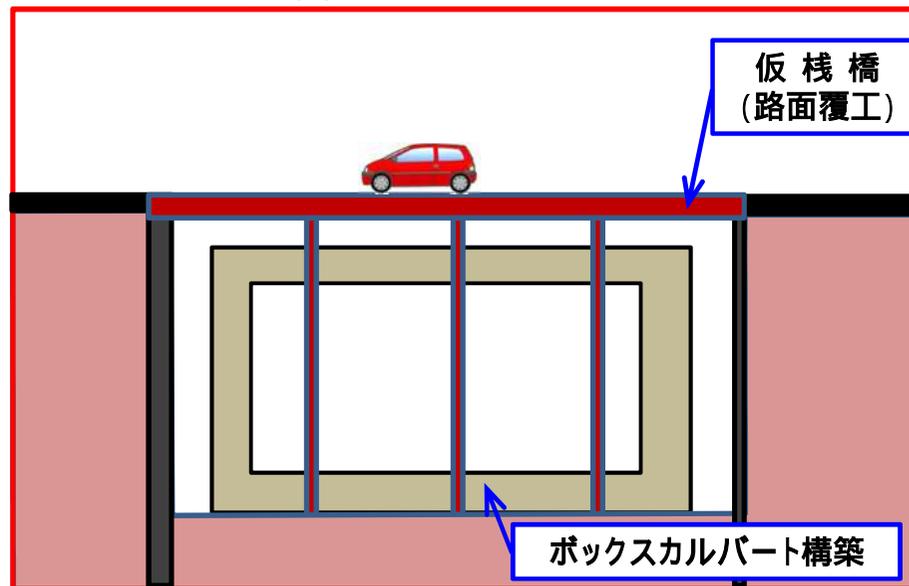


断面図

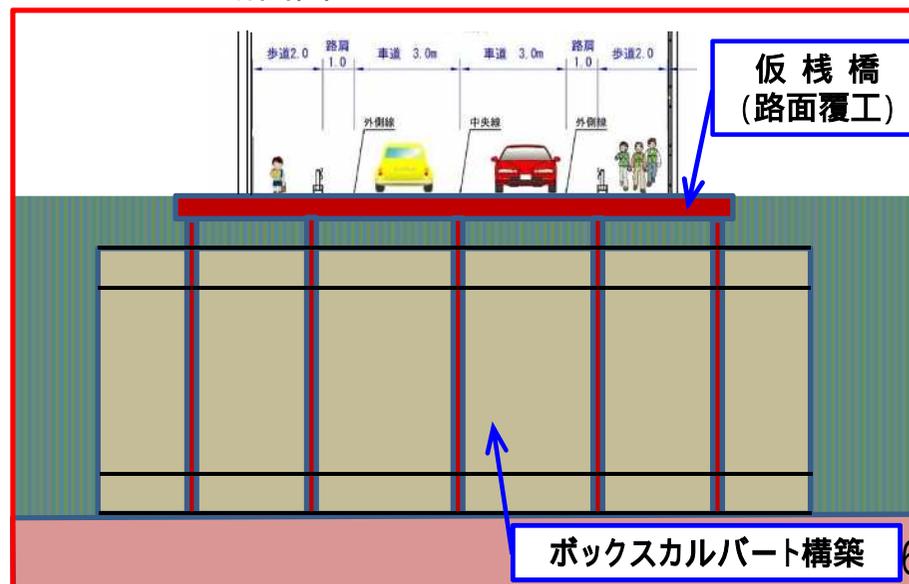


# 土留め工と東映通りの切り替えステップ


現在の東映通り

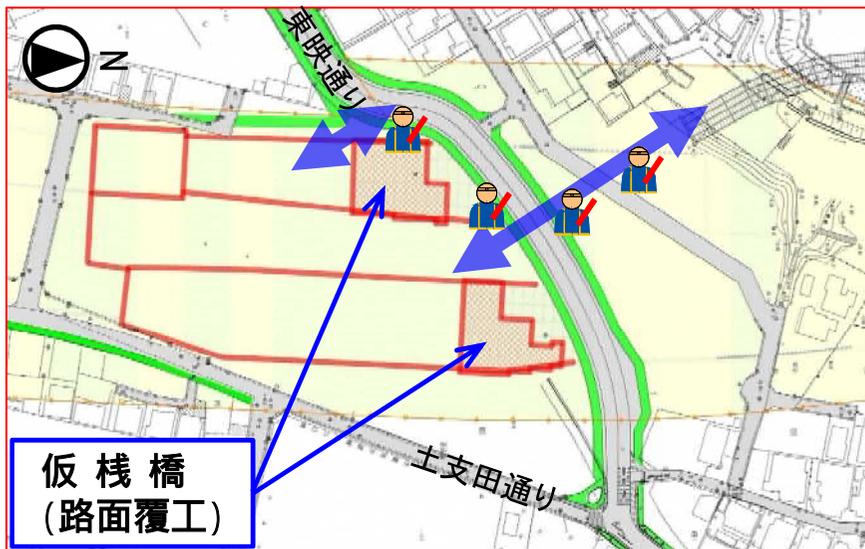


平成29年 春ごろの東映通り

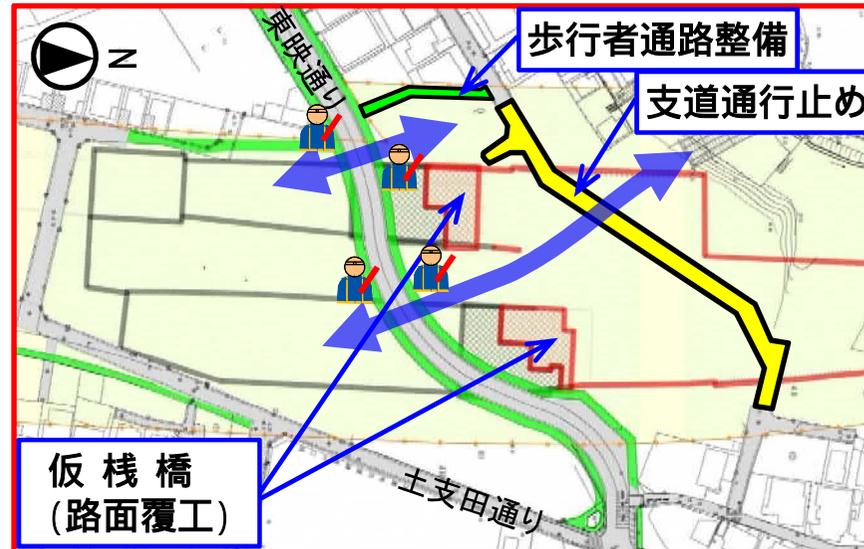

平成29年 秋ごろの東映通り

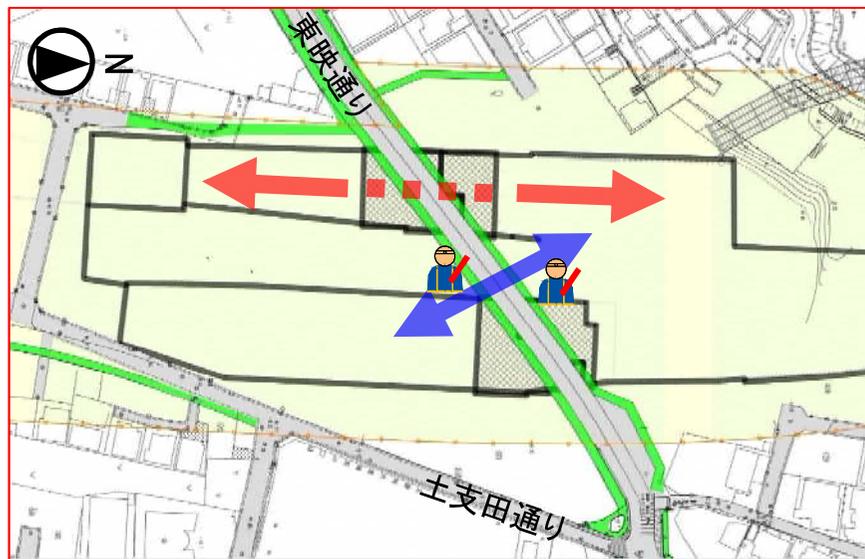

東映通り地下横断面図

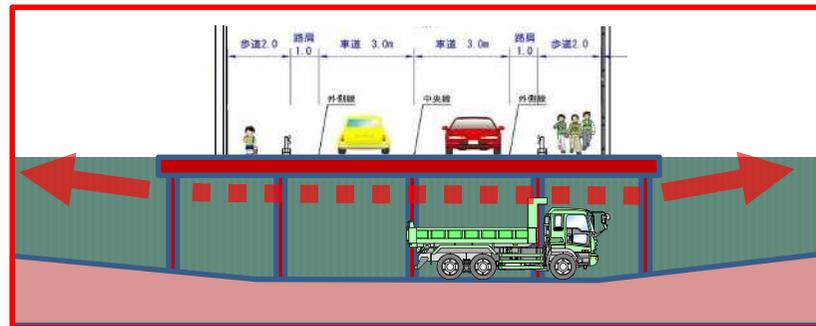

施工会社

- 仮棧橋 : 戸田建設 (株)
- 仮棧橋 : 飛島建設 (株)

凡例


- 赤線 土留め・仮棧橋施工箇所
- 黒線 土留め・仮棧橋完了箇所
- 緑線 歩行者通路
- 青・赤二色矢印 工事用車両平面横断箇所
- 赤・青二色矢印 工事用車両地下横断箇所

東映通りの切替え時期は、関係機関との調整・天候等により変更が生じる場合があります。  
(切り替えの日時は、看板等で事前にお知らせをいたします。)

# 廃止となる支道【現況写真】



# 土支田通りの切り替え

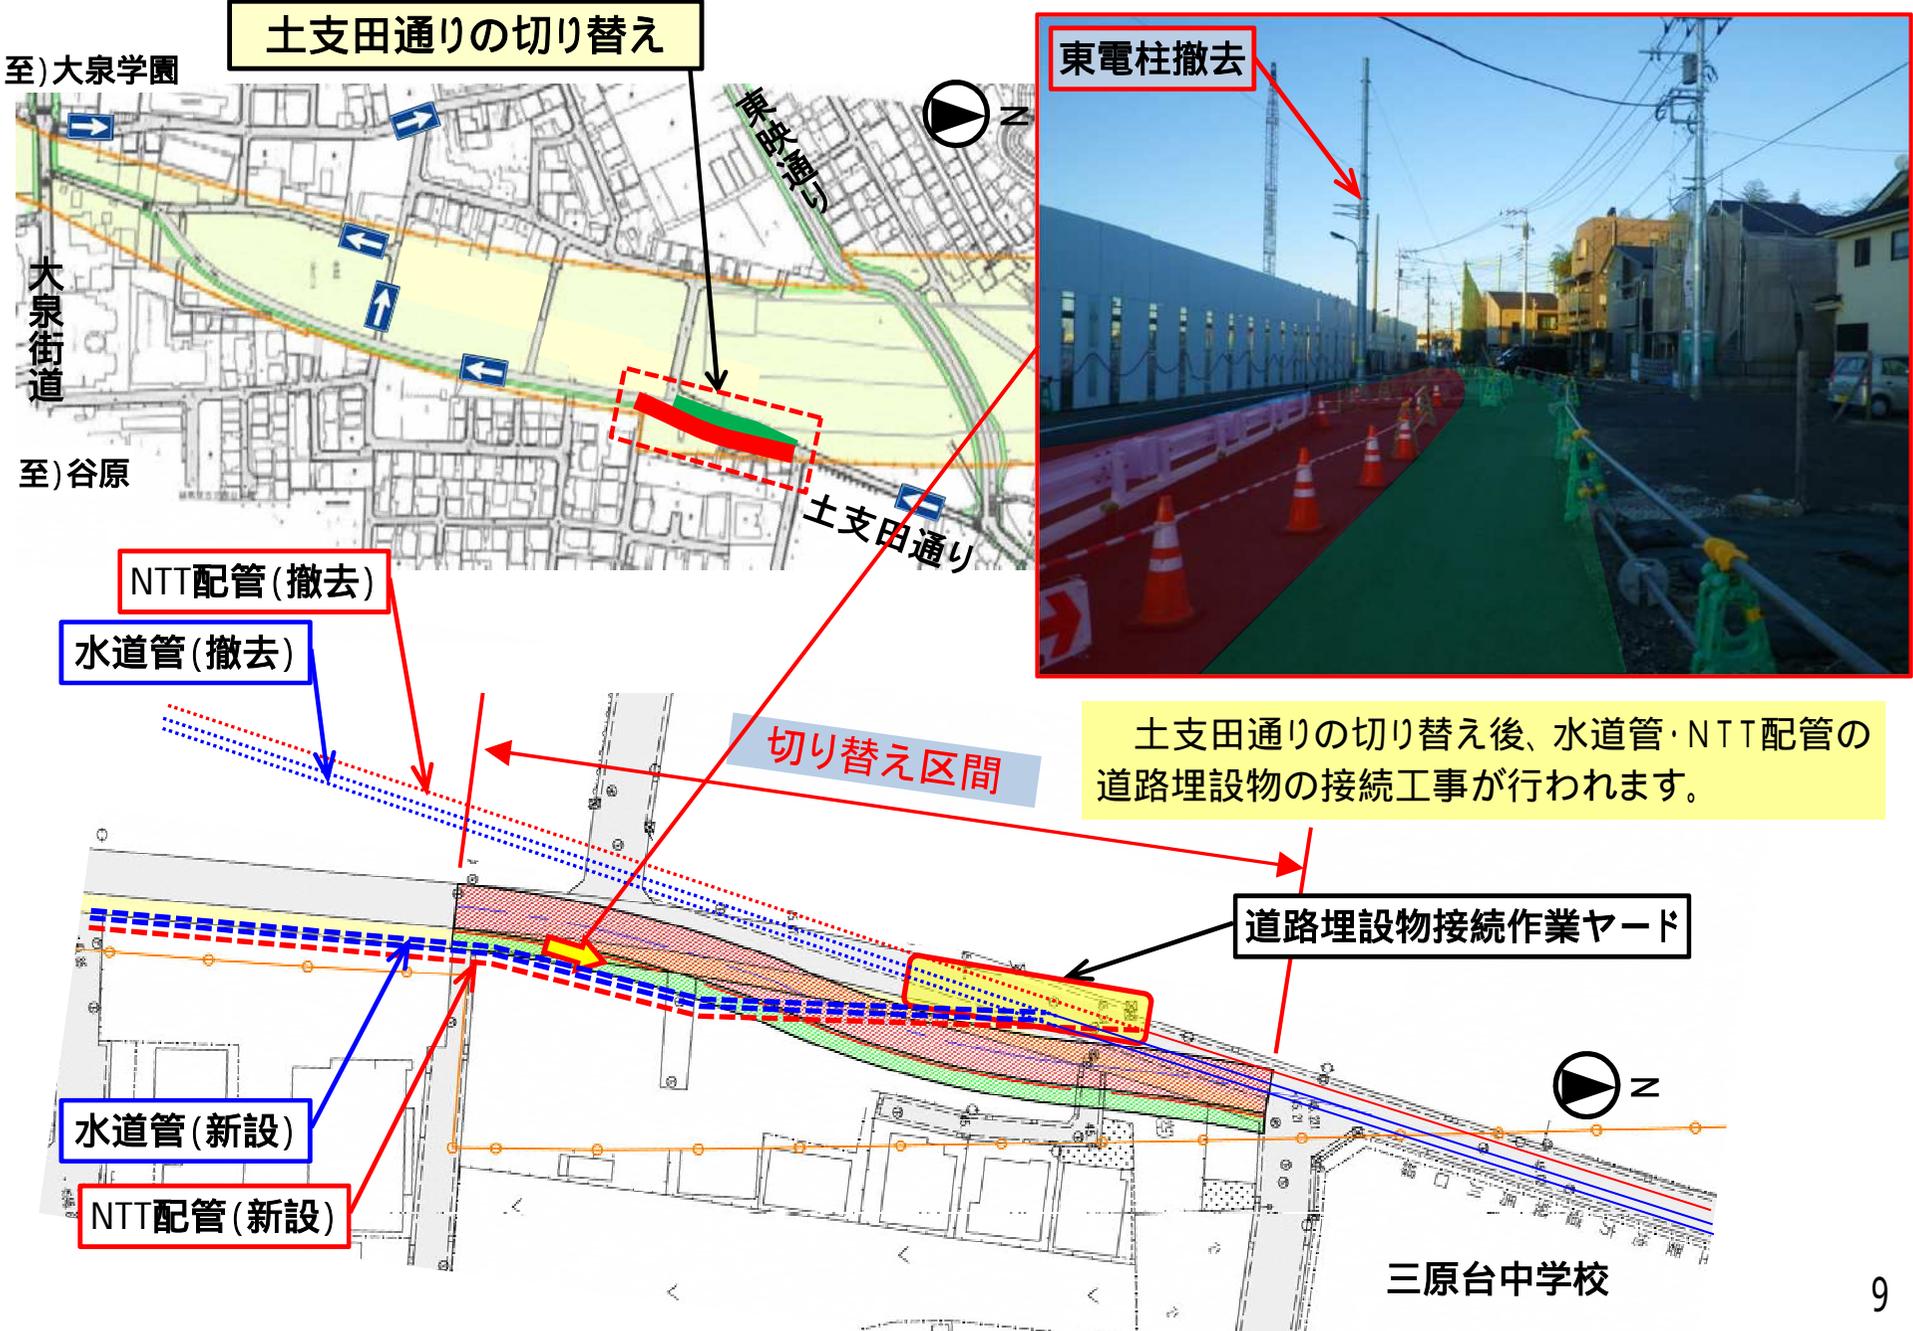

たいへんご不便をお掛けいたしますが、  
安全最優先で工事を進めて参ります。  
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
