

第8回 外環事業に伴う大泉ジャンクション周辺地区安全対策等連絡会

上部工工事に伴う目白通り交通規制について

平成30年11月 2日

工事名) 大泉ジャンクションCランプ第一橋
(鋼上部工) 工事
発注者) 東日本高速道路(株) 東京外環工事事務所
受注者) (株)横河ブリッジ

1. 工事の進捗状況

平成30年 9月撮影




2. Aランプ第二橋の架設工事 手順(1)


凡例

完了した作業


Step1 びくに公園側の施工ヤード内で準備工事を進めました。

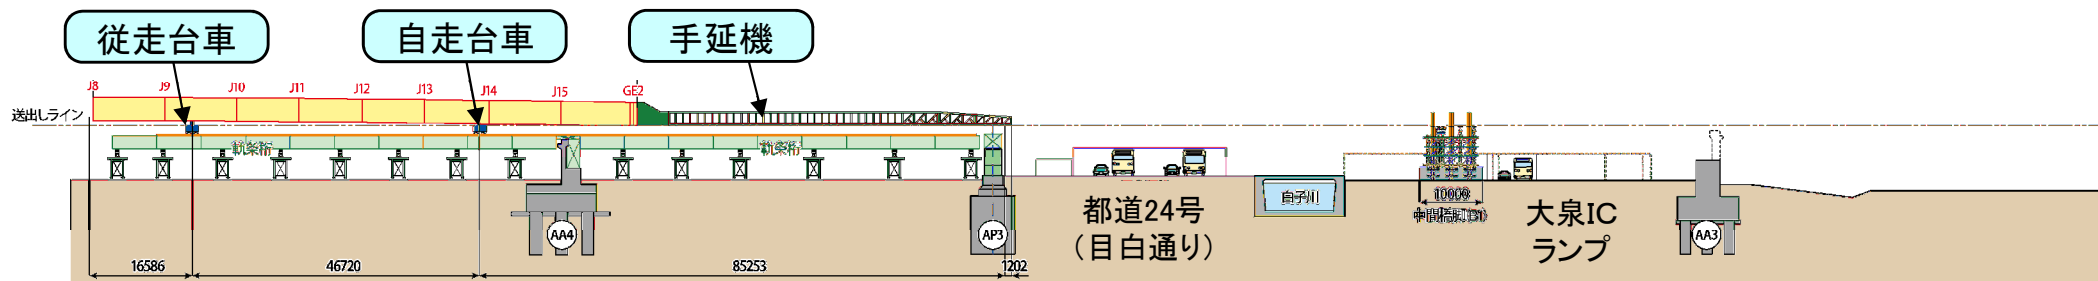

Step2 交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁をびくに公園側(南側)より送出し架設しました。
H30年7月3日(水) 21時~翌5時

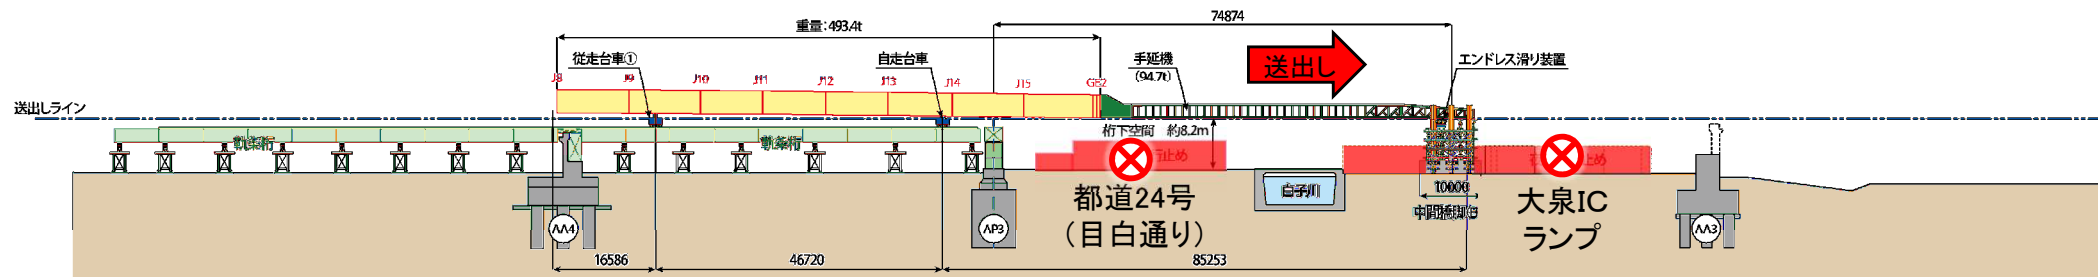

Step3 現在、再度、びくに公園側の施工ヤード内で準備工事を進めます。

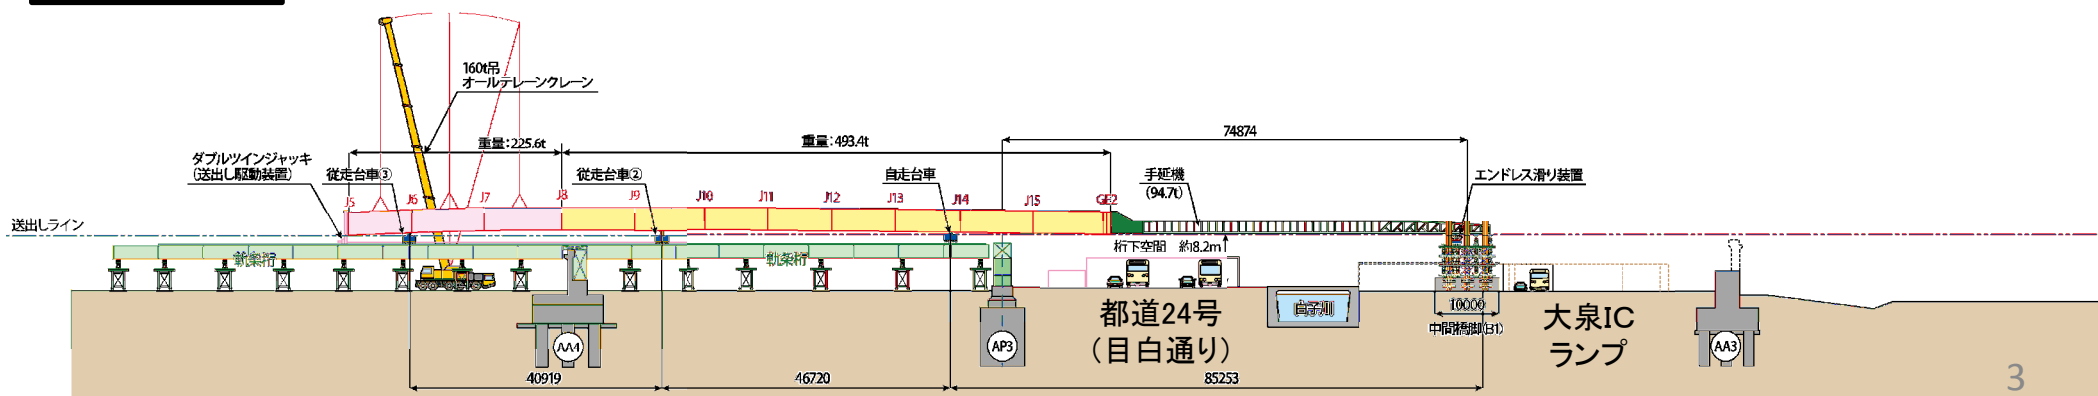


2. Aランプ第二橋の架設工事 手順(2)

凡例

 通行止めが伴う作業


Step4

交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁をびくに公園側(南側)より送出し架設します。
H30年11月12日(月)~11月15日(木)の4日間連続で施工予定

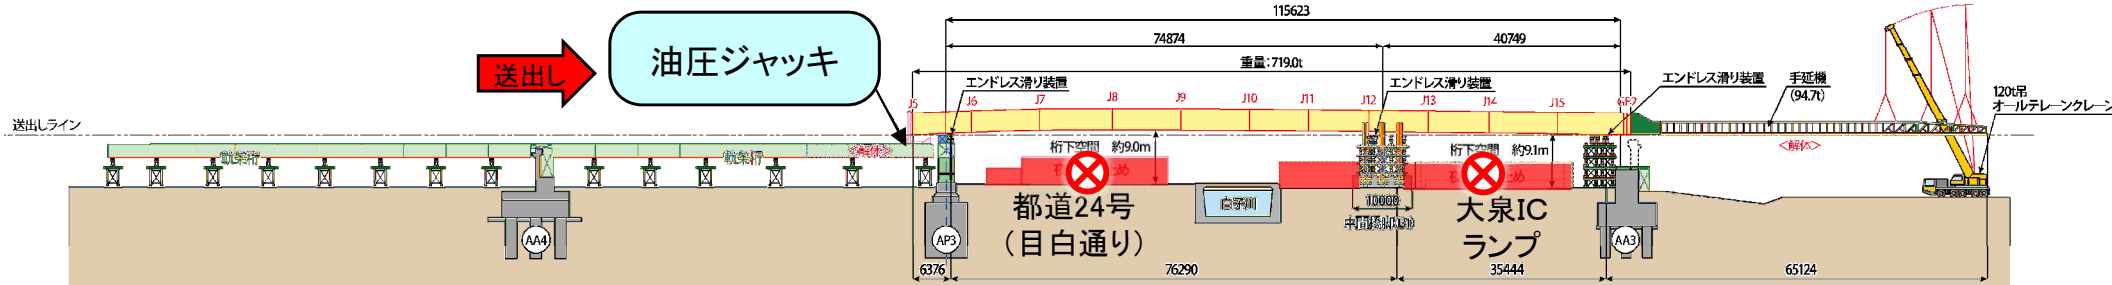


Step5

交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁の降下作業を行います。
H30年11月26日(月)~12月19日(水)のうち平日6日間で施工予定

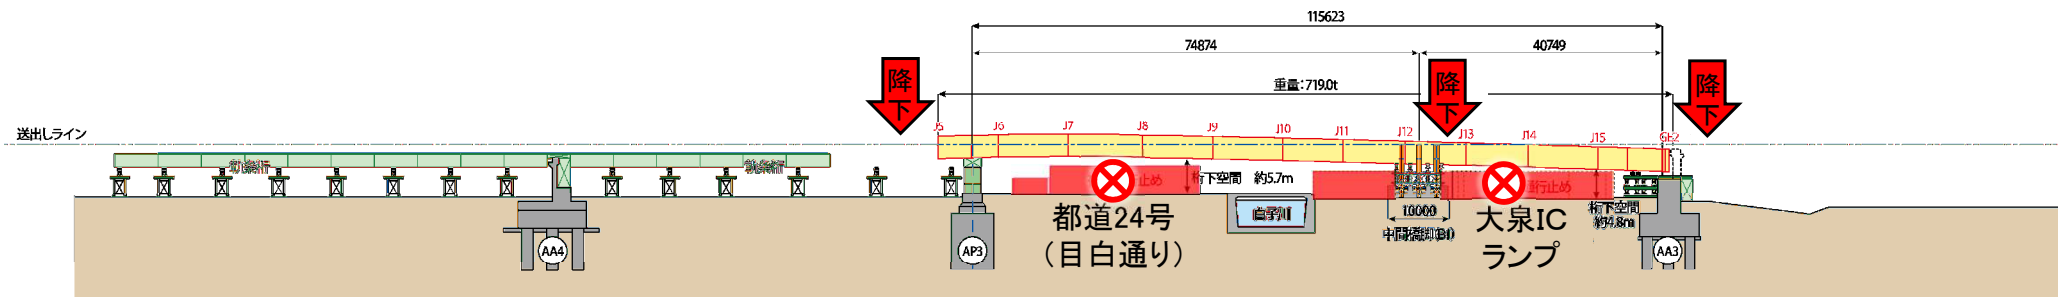

Step6

最後にびくに公園側施工ヤード内で架設工事を行います。

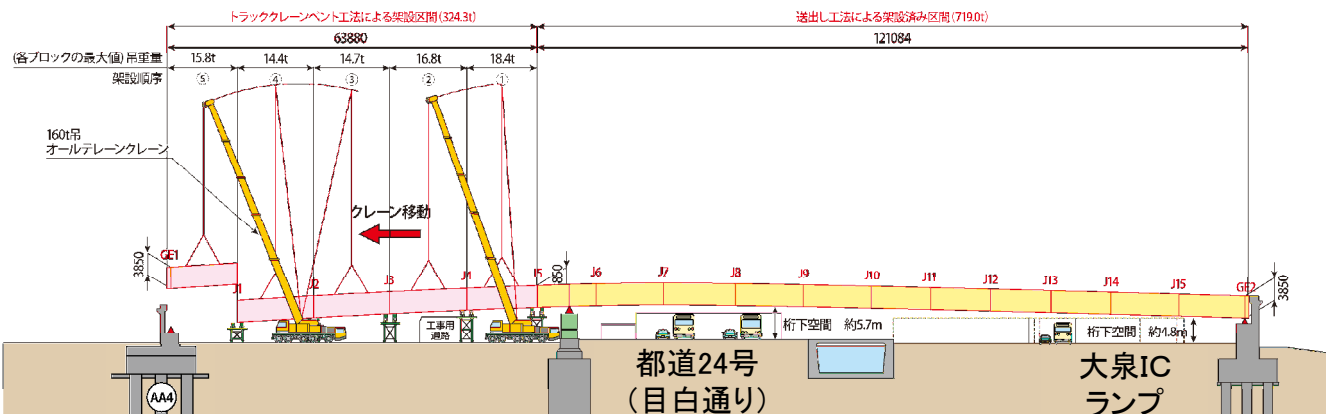

3. 架設時の交通規制スケジュール

11月11日(日)	11月12日(月)	11月13日(火)	11月14日(水)	11月15日(木)	11月16日(金)	11月17日(土)
	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	
11月18日(日)	11月19日(月)	11月20日(火)	11月21日(水)	11月22日(木)	11月23日(金・祝)	11月24日(土)
	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>				
11月25日(日)	11月26日(月)	11月27日(火)	11月28日(水)	11月29日(木)	11月30日(金)	12月 1日(土)
	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>			<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	
12月 2日(日)	12月 3日(月)	12月 4日(火)	12月 5日(水)	12月 6日(木)	12月 7日(金)	12月 8日(土)
	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>		<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>		
12月 9日(日)	12月10日(月)	12月11日(火)	12月12日(水)	12月13日(木)	12月14日(金)	12月15日(土)
	<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>			<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	
12月16日(日)	12月17日(月)	12月18日(火)	12月19日(水)	12月20日(木)	12月21日(金)	12月22日(土)
	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>		<p>実施日</p> <p>← 21時 5時 →</p>	<p>予備日</p> <p>← 21時 5時 →</p>		

4. 架設時の交通規制・迂回路 (1)

広域迂回



4. 架設時の交通規制・迂回路 (2)



狭域迂回
(車利用者)



4. 架設時の交通規制・迂回路 (3)



狭域迂回
(歩行者・自転車)

迂回にご協力をお願いします。
