

# 東京外かく環状道路 大泉JCT工事の状況について

## 大泉JCT地区の工事について



# 大泉ジャンクション 現状の工事用車両ルート&工事用出入口




■作業日・作業時間  
 原則作業日 月曜日～土曜日  
 作業時間 午前8時～午後6時  
 ※高速道路内においては夜間作業を実施する場合があります。

●工事用車両は、原則として、外環道及び都道を走行しますが、施工箇所間の移動のため、一部車両は区道を通行します。  
 ●出入口には、交通誘導員を配置し、歩行者及び一般車両を優先いたします。


# 現在の工事用車両ルートについて

■作業日・作業時間  
 原則 作業日 月曜日～土曜日 ※祝日は除く  
 作業時間 午前8時～午後6時  
 ※氷川橋の解体作業等、一部夜間作業を予定。

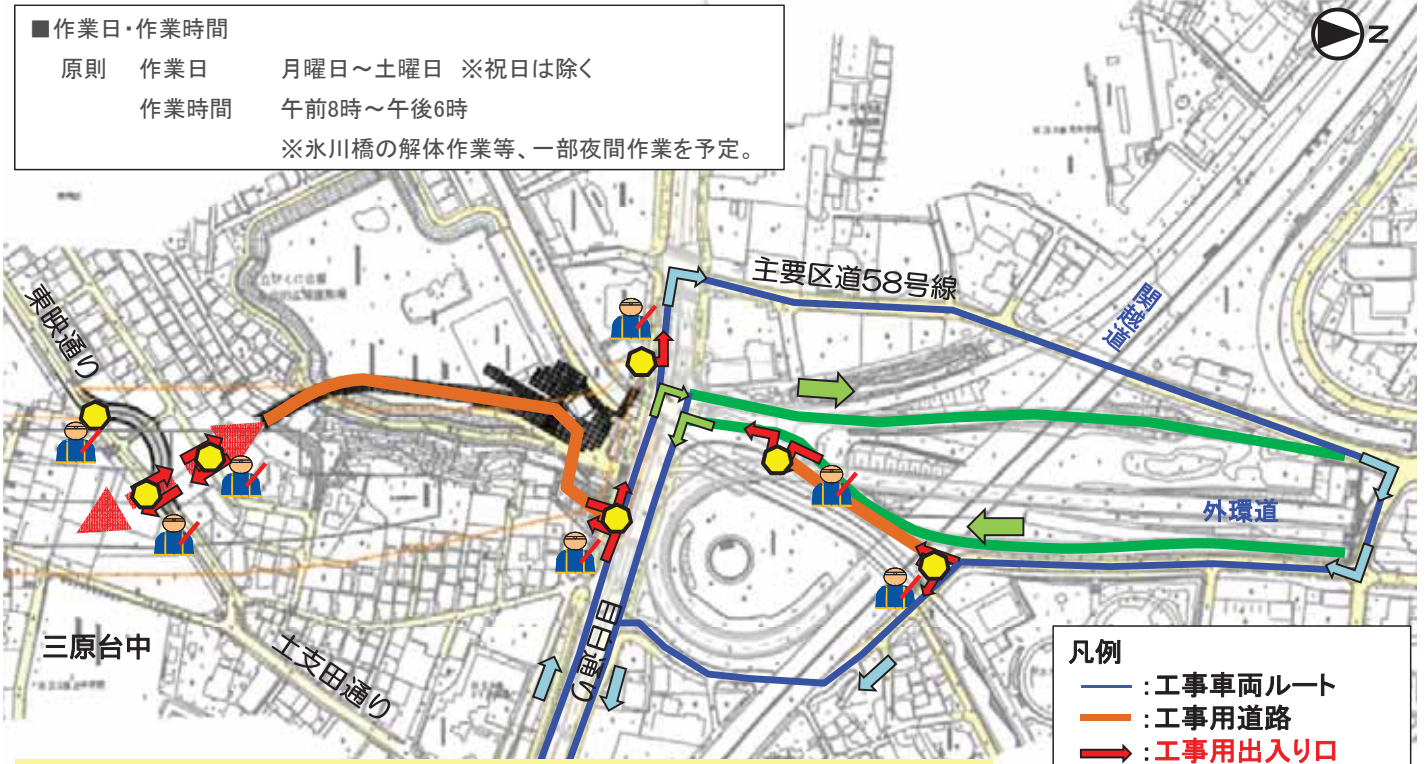


●工事用車両は、原則として、高速道路及び都道(目白通り)を通行しますが、一部の車両は主要区道58号線などの区道を通行します。  
 ●東映通り北側の児童通学路については、登校時の通学時間帯は通行しません。  
 ●各出入口及び道路横断箇所には、交通誘導員を配置し、歩行者及び一般車両を優先いたします。

# 現在の工事車両の出入り口について

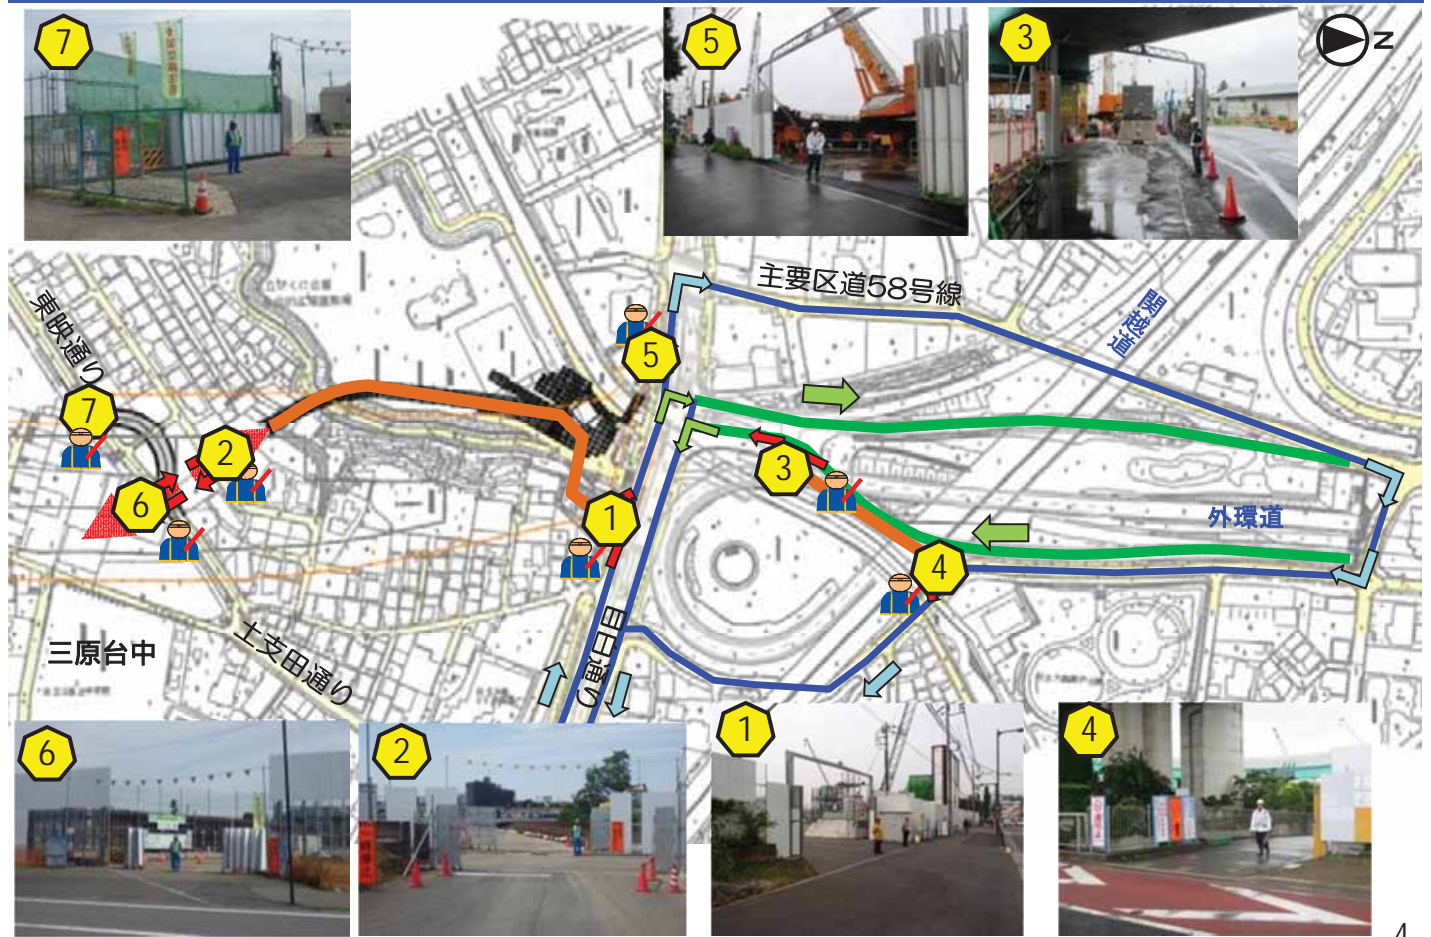


# 現在のカーブミラー、街路灯等の設置箇所について

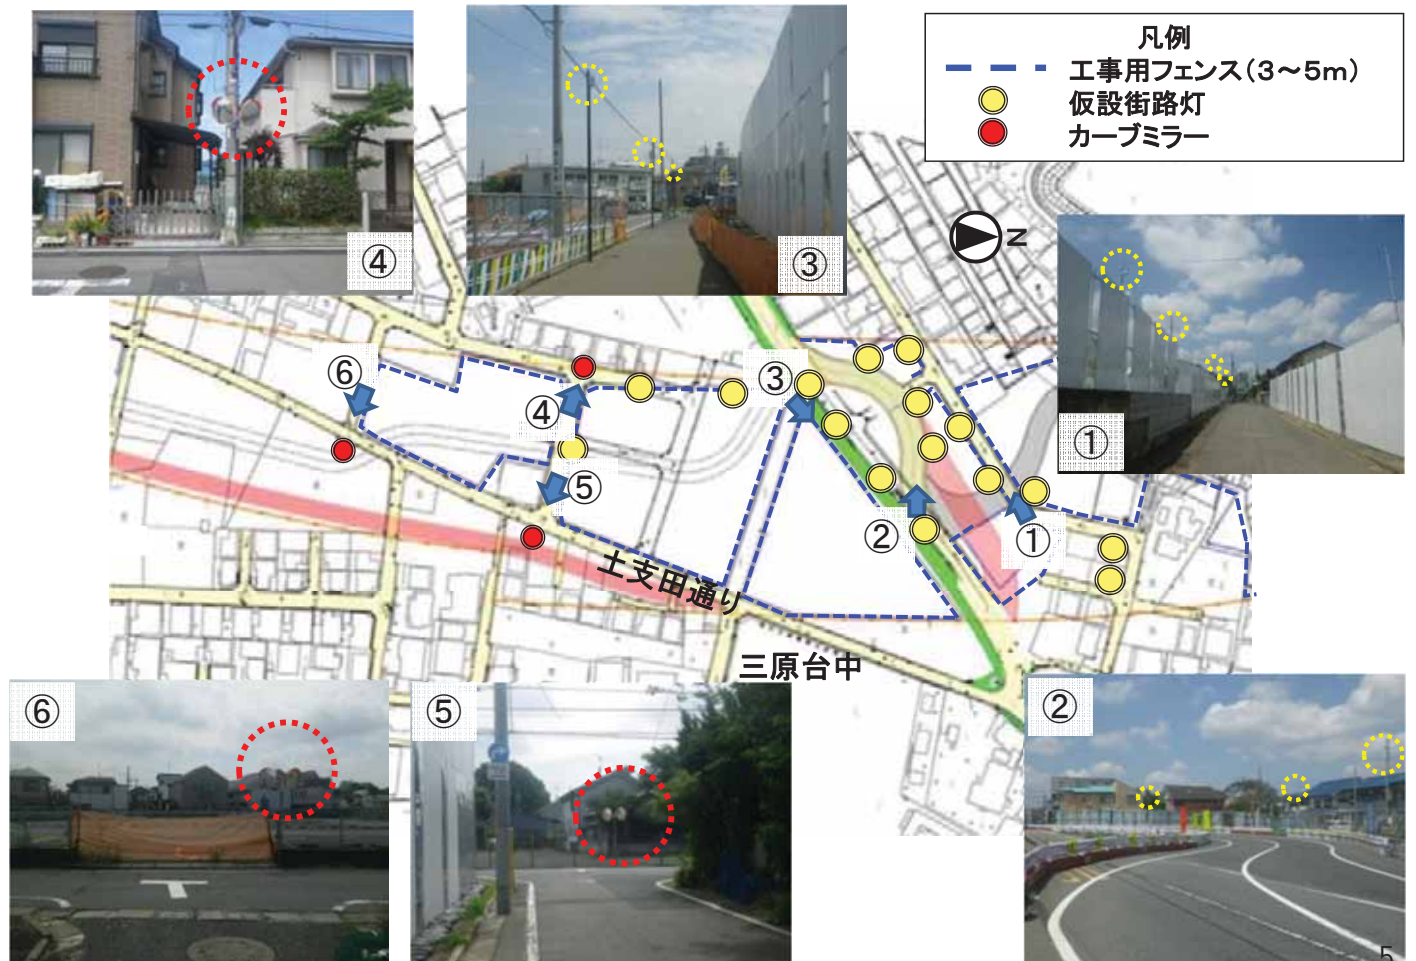

## 現在の東映通りについて

現在、東映通りの一部では、土留めに支障となる埋設管を撤去するため、継続して東映通りの切り替えを行っております。

### ■ 位置図

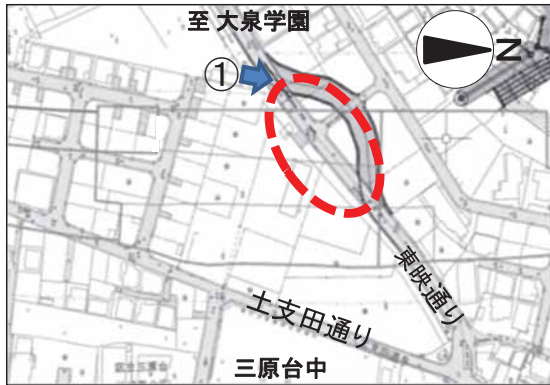


### ■ 拡大図



### ■ 現況写真



### ■ A-A断面図

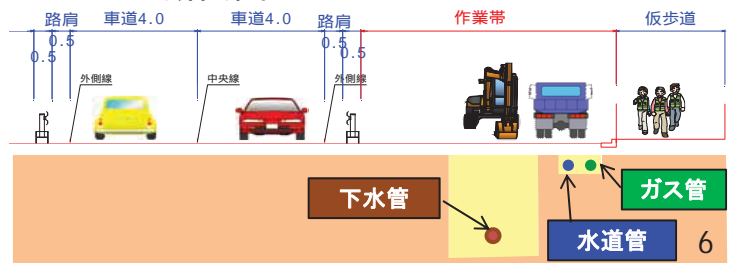


## 現在の土支田通りについて

現在、工事用フェンスの移設と道路の切り替えを行っております。


### ■ 位置図



### ■ 拡大図

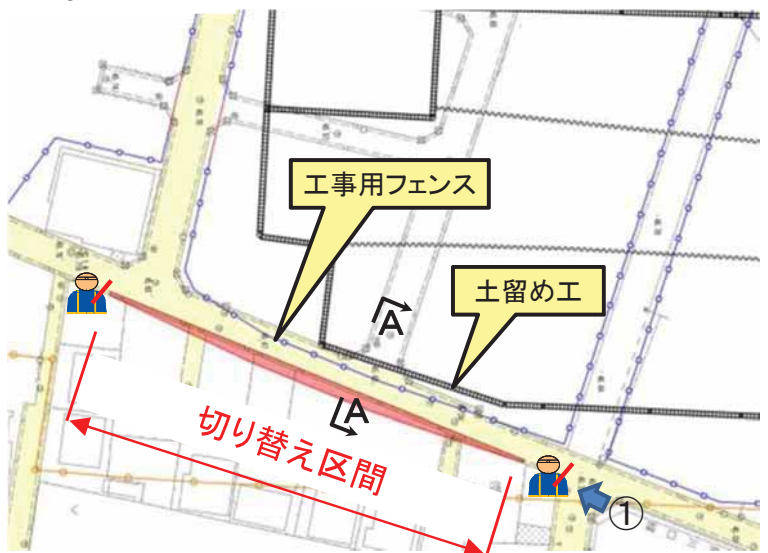

### ■ A-A断面図


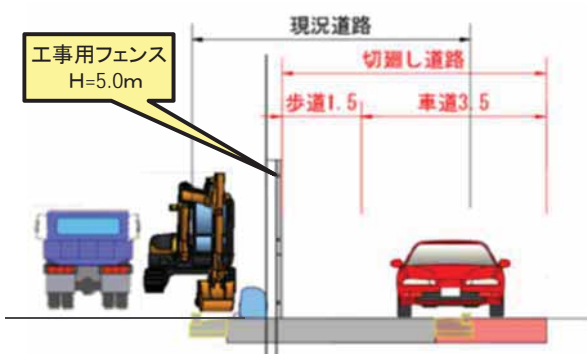


### ■ 現況写真



# 今後の道路形態について

- ①東映通り北側の児童通学路の切り替え(7月末頃供用開始)
- ②工専用フェンス設置(7月25日設置)
- ③東映通りの切り替え延伸(8月頃供用開始)
- ④土支田通りの切り替え(10月頃供用開始)

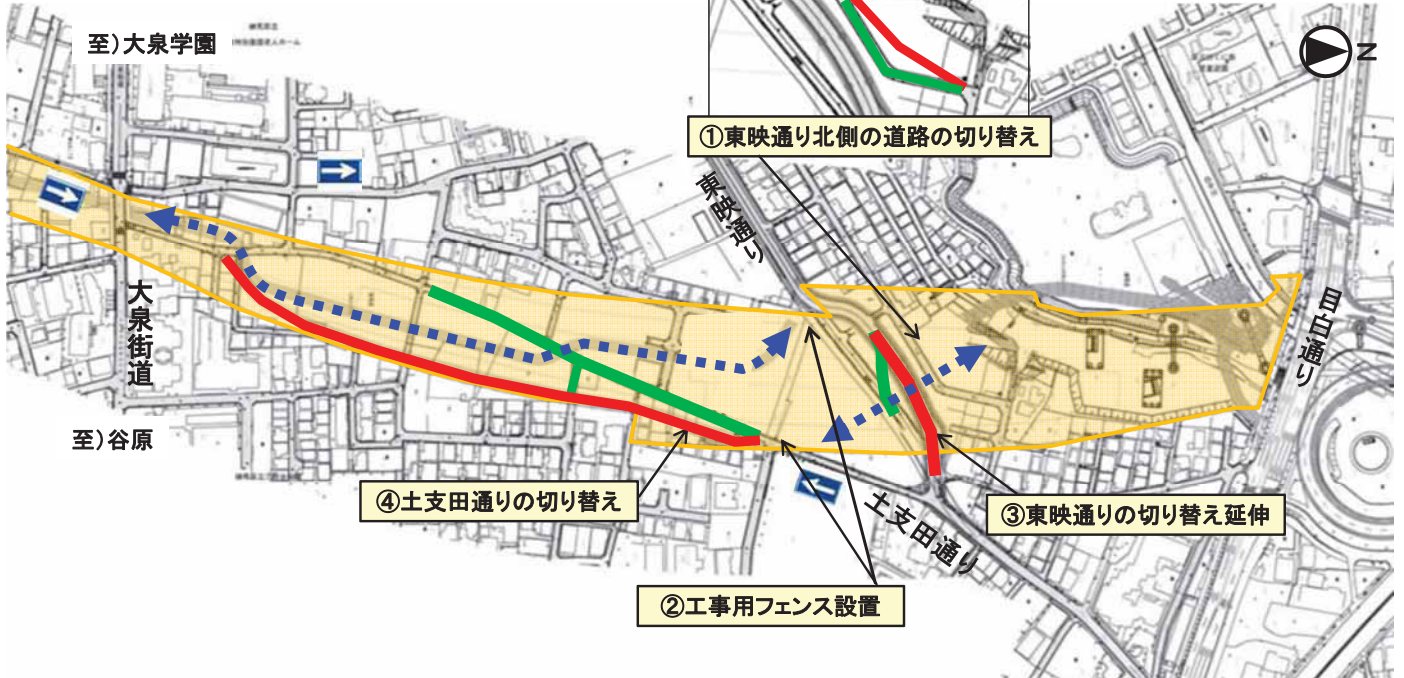


工専用道路は、工事の進捗及び用地取得状況により、事業用地内での切り替えが発生します。

## ①東映通り北側の児童通学路の切り替えについて

東京都が埋蔵文化財調査を行うため、7月末頃より道路の切り替えを行います。

### ■ 拡大図

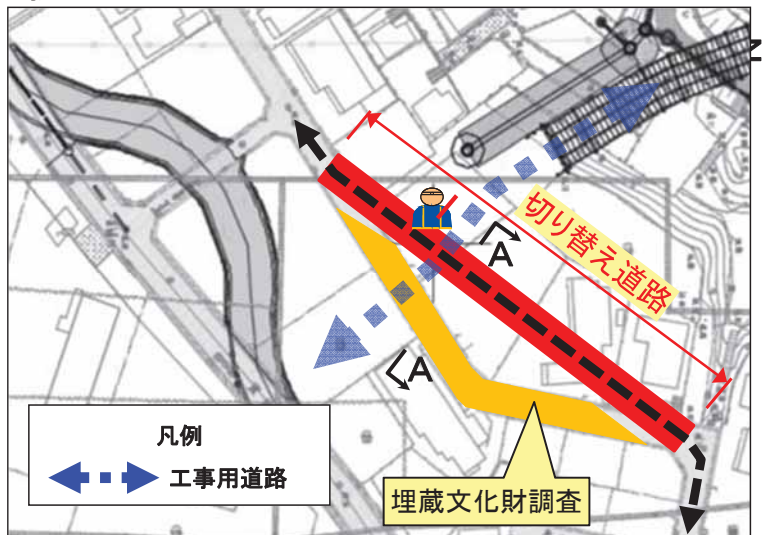


### ■ 位置図



### ■ 現況写真




### ■ A-A断面図



切り替えの日時は、看板等で事前にお知らせをいたします。  
切り替え道路の整備の際、通行止めはいたしません。  
切り替え道路には、仮設照明灯を設置します。

## ②工事用フェンス設置について

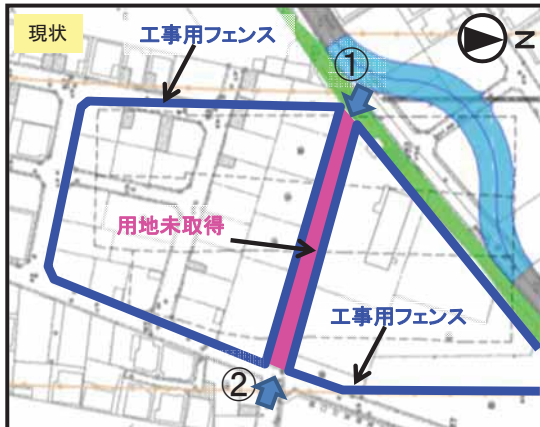

現在は、用地未取得の箇所を避けて、工事用フェンスを設置しています。

### ■ 現況写真




7月25日に工事用フェンスを設置いたします。



10

## ③東映通りの切り替え延伸について

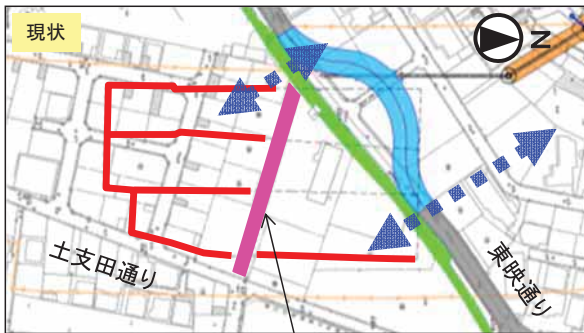


用地未取得範囲

### 1. 東映通りを東側へ延伸



H28. 8月

### 2. 東映通りを南側へ切り替え

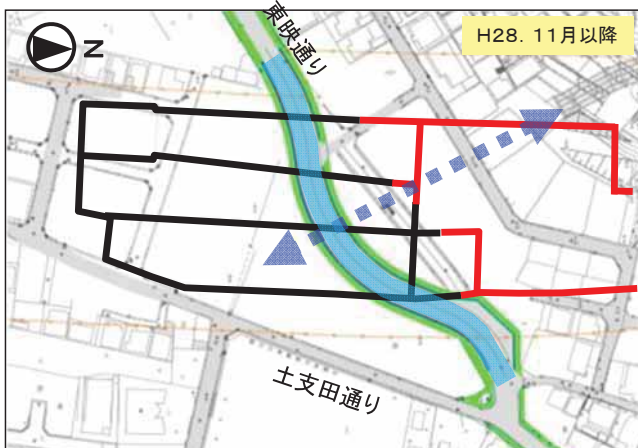

H28. 11月以降


凡例	
<span style="color: red;">—</span>	土留め施工箇所
<span style="color: black;">—</span>	土留め完了箇所
<span style="background-color: lightblue;">—</span>	車道切り廻し
<span style="background-color: lightgreen;">—</span>	歩行者通路
<span style="color: blue;">—</span>	工事用車両横断箇所

※東映通りの切り替え時期は、関係機関との調整・天候等により変更が生じる場合があります。

(切り替えの日時は、看板等で事前にお知らせをいたします。)

11


## ④土支田通りの切り替えについて

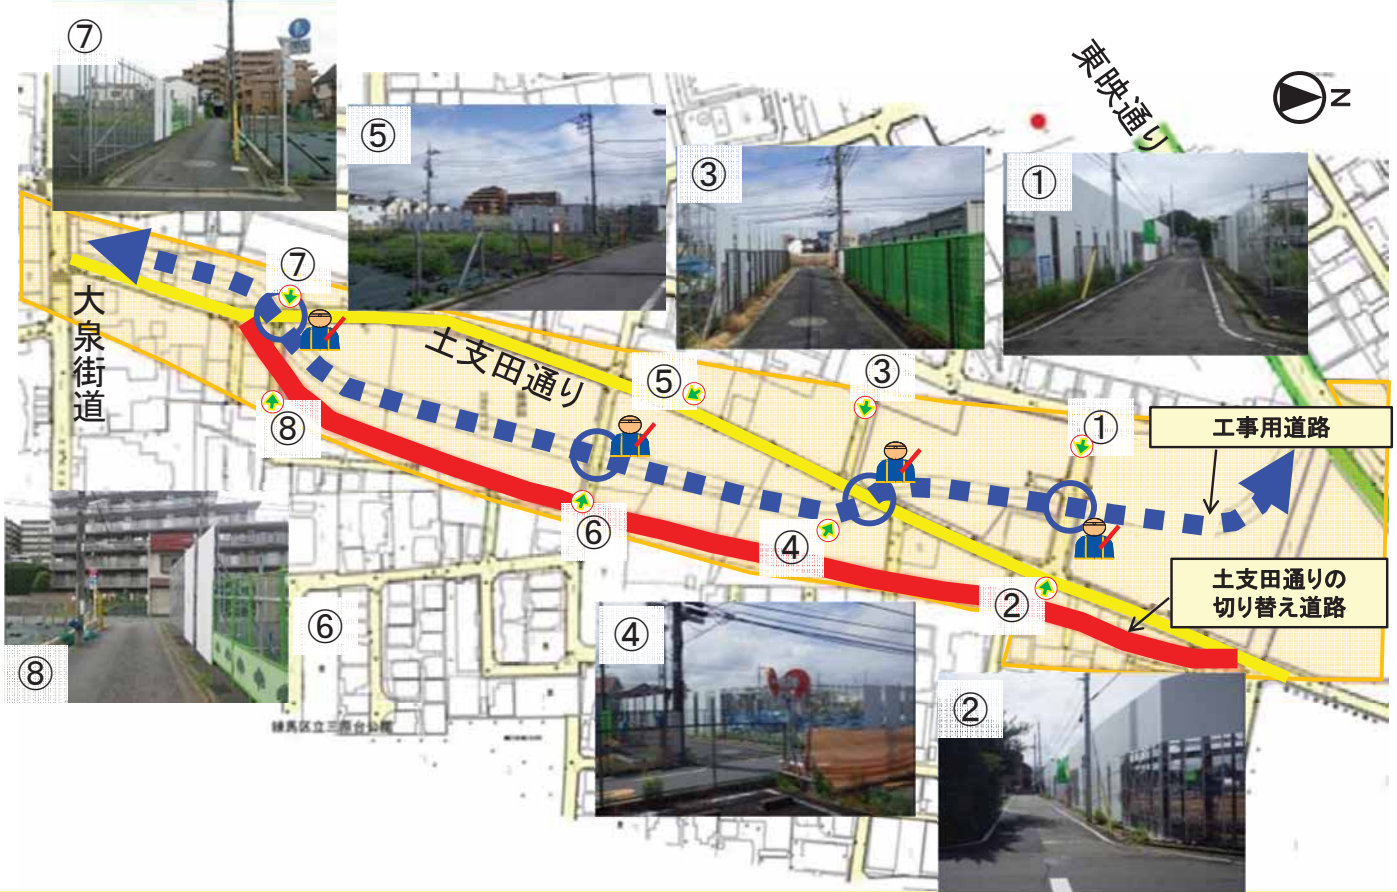

工事用道路と既設道路との交差箇所には、工事用ゲートを設置し、工事用車両通行の際は、交通誘導員を配置します。

12

## ④土支田通りの切り替えについて

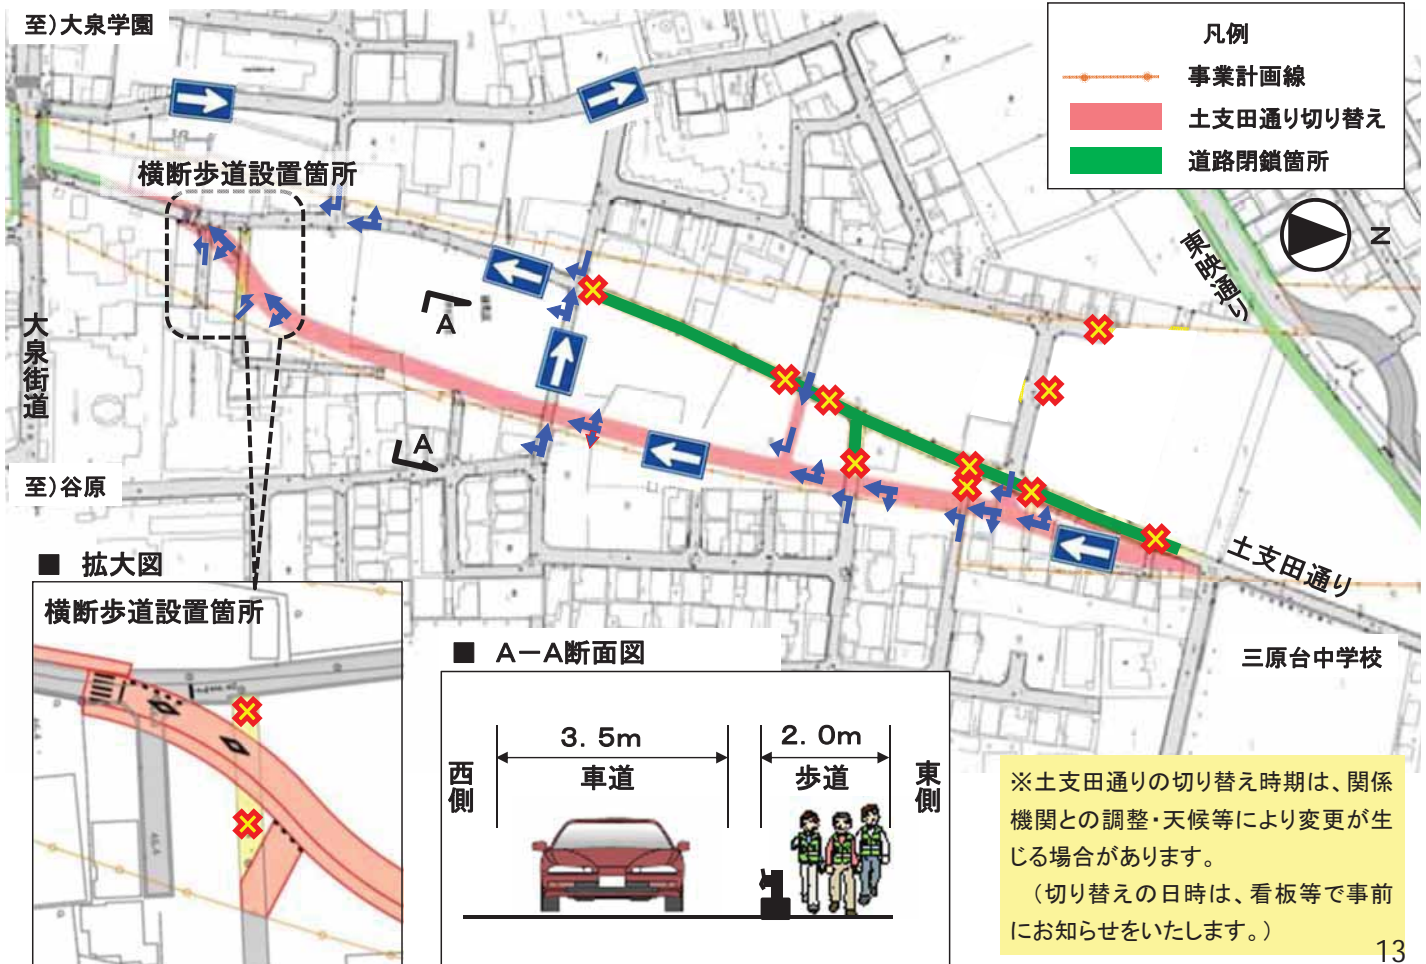

13

たいへんご不便をお掛けいたしますが、  
安全最優先で工事を進めて参ります。  
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
